Universidad ICESI

45 años

Ciclos de vida / Enfoques Para la Gerencia de Proyectos

Elizabeth Muñoz, MSc

Hugo Arboleda, PhD

Luis Mario Lenis

Universidad ICESI

Matriz de Stacey

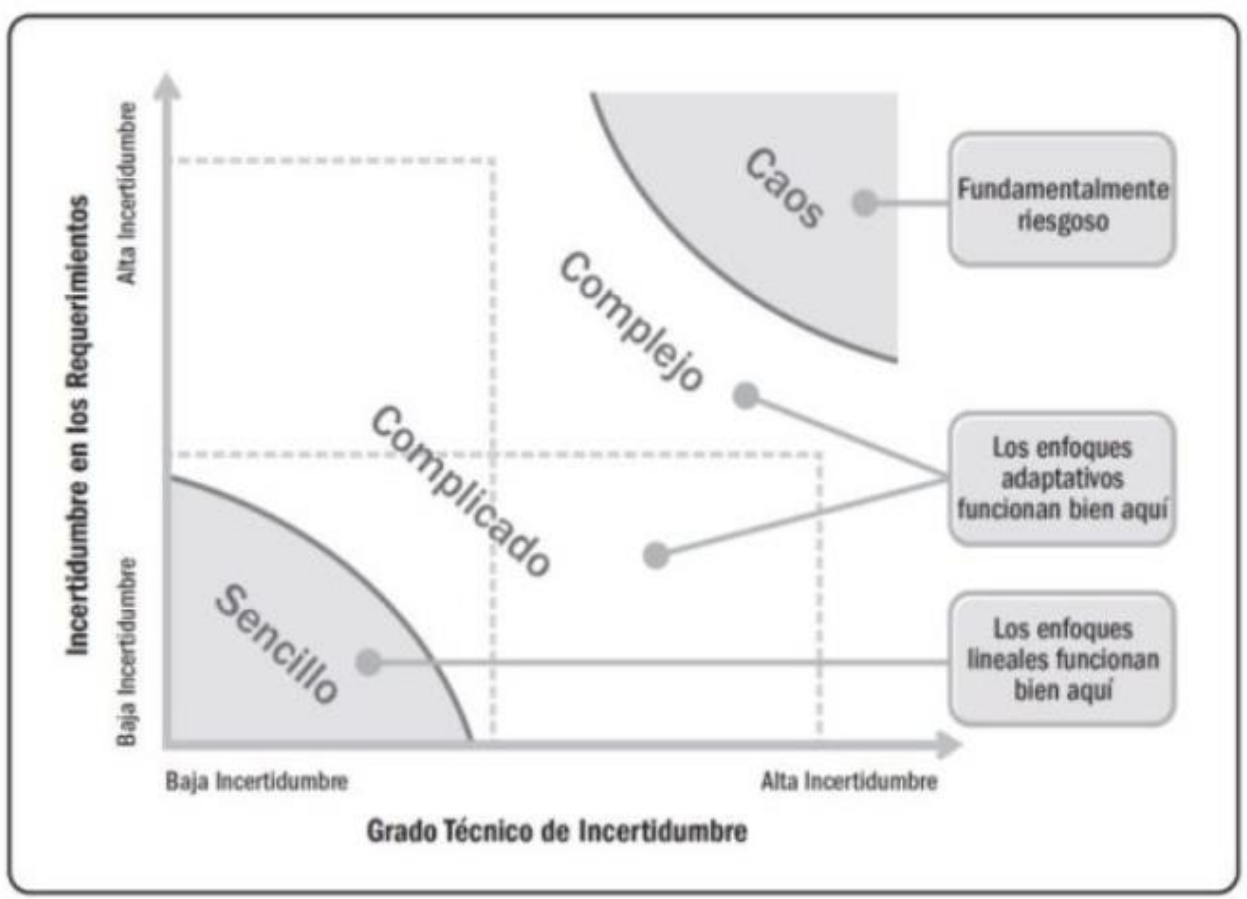

Matriz de Stacey

Universidad ICESI

Ciclo de vida

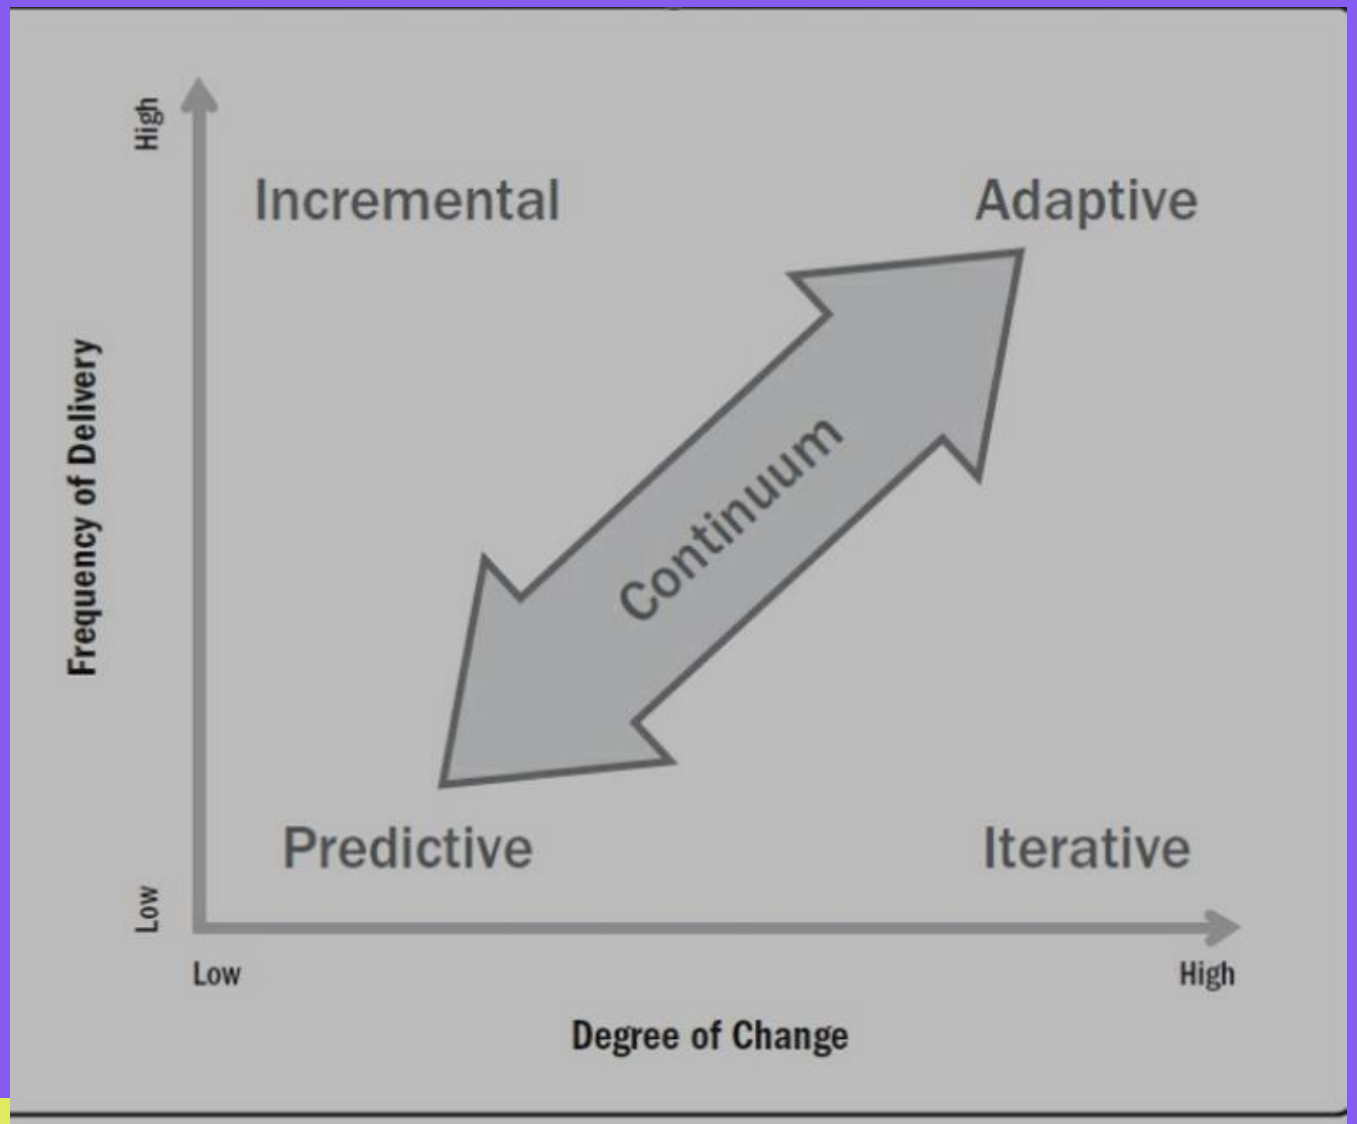

Figure 2-1. Life Cycle Continuum

Agenda – Sesión 4

- Taller de selección de enfoques / ciclo de vida de la gerencia de proyectos.

Proyecto 1. Alcance

Se requiere construir una plataforma colaborativa para usar equipos de cómputo en una comunidad de científicos de datos. Se conocen los requerimientos funcionales de toda la plataforma.
Actualmente se desconoce el tipo de infraestructura de hardware requerida, el proyecto incluye realizar el estudio para conocer dicha infraestructura, lo cual toma 1 mes.
La interfaz gráfica puede ser definida con total libertad por los desarrolladores.
El presupuesto es de $2000MM y el plazo de entrega es de 12 meses, lo cual se estima más que suficiente por el líder del proyecto.

Universidad ICESI

45 años

Planeación

Análisis de Requerimientos

Diseño

Desarrollo

Pruebas

Universidad icesi

- Riesgo bajo

Solución con ...

- Procedimientos y requerimientos claros y probados.
- Equipos estables.
- Planes detallados desde el inicio.
- Entrega de valor solo al final.



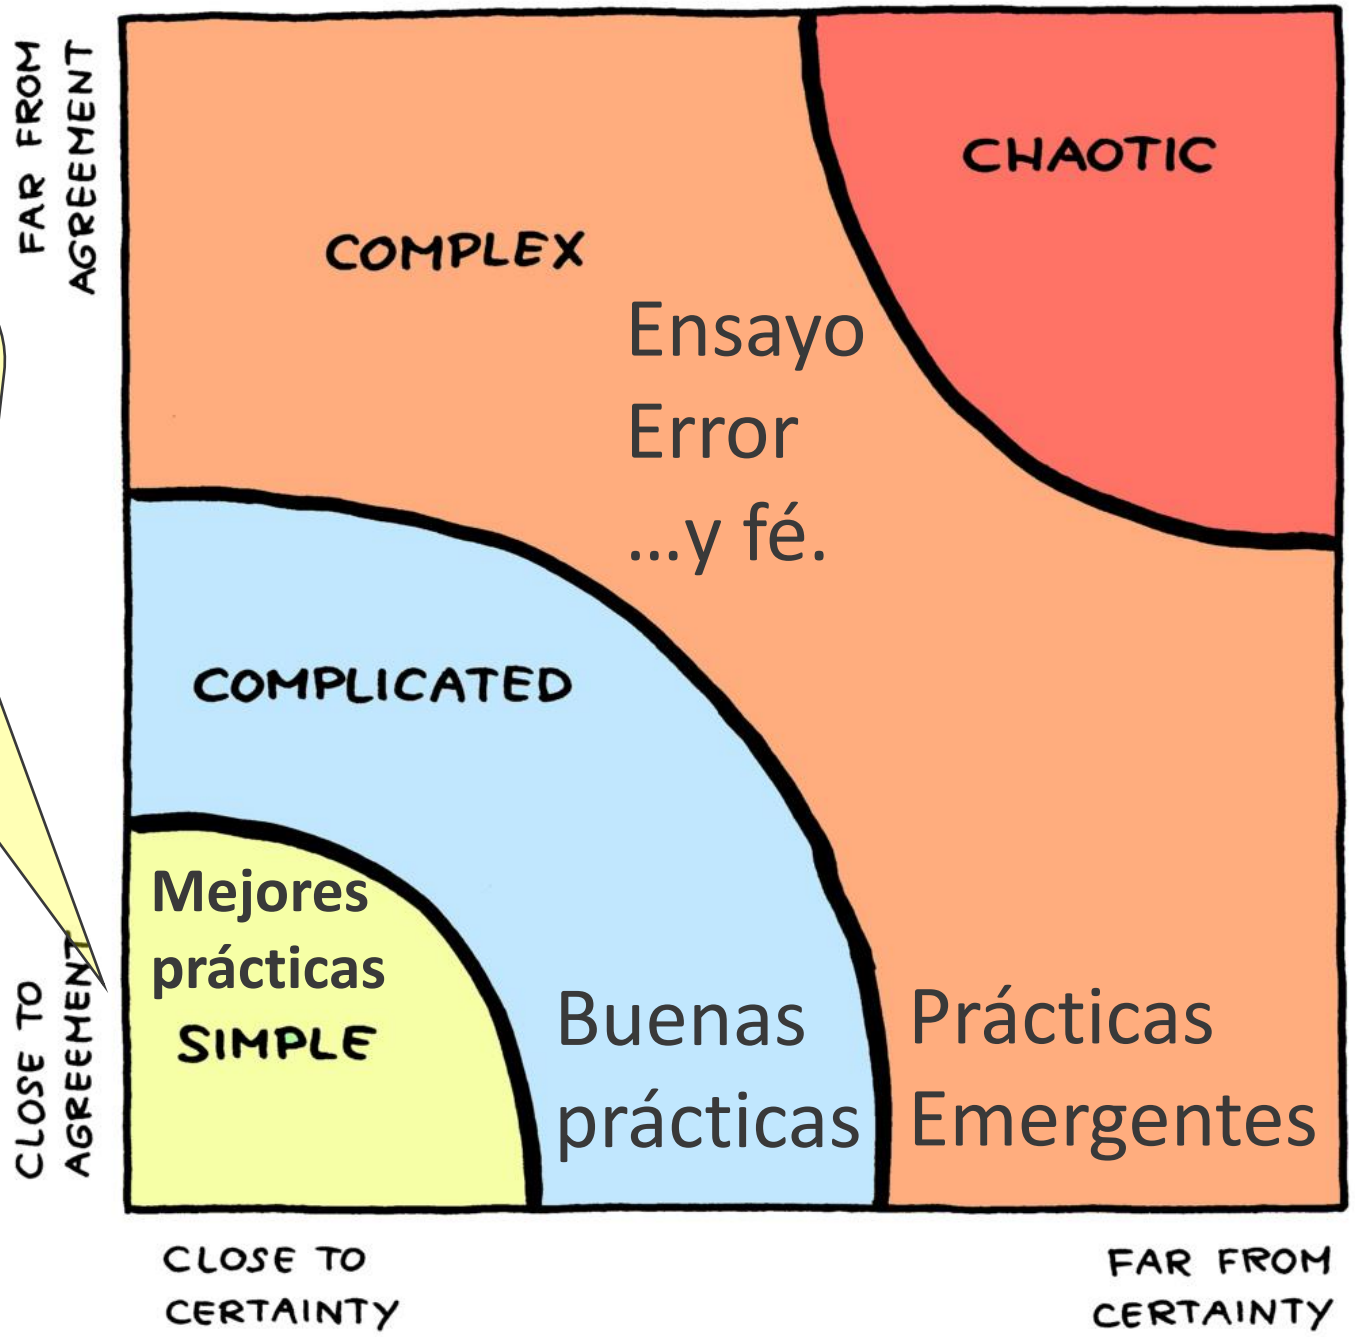

Proyecto 2. Alcance

Se requiere construir una plataforma colaborativa para usar equipos de cómputo en una comunidad de científicos de datos. Se conocen los requerimientos funcionales de toda la plataforma.

Actualmente se desconoce el tipo de infraestructura de hardware requerida, el proyecto incluye realizar el estudio para conocer dicha infraestructura, lo cual toma 1 mes.

El cliente desea ver un diseño inicial en dos semanas y hacer comentarios para tenerlo listo en 1 mes y 3 semanas.

Si bien el cliente tiene presupuesto flexible, requiere tener un presupuesto inicial en un mes, y el presupuesto final en 1 mes y 3 semanas.

El plazo de entrega final es de 12 meses.

Universidad ICESI

- Cambio implícito, complejidad incierta.
- Percepción constante del equipo (cliente y desarrolladores) requerida.

Solución con…

- Retroalimentación temprana, basada en trabajo parcial o completado.
- Entregas constantes, prototipado.

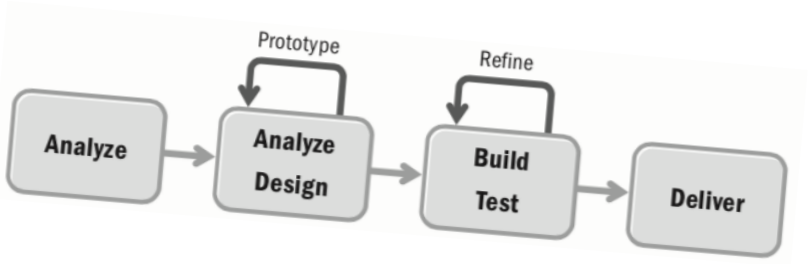

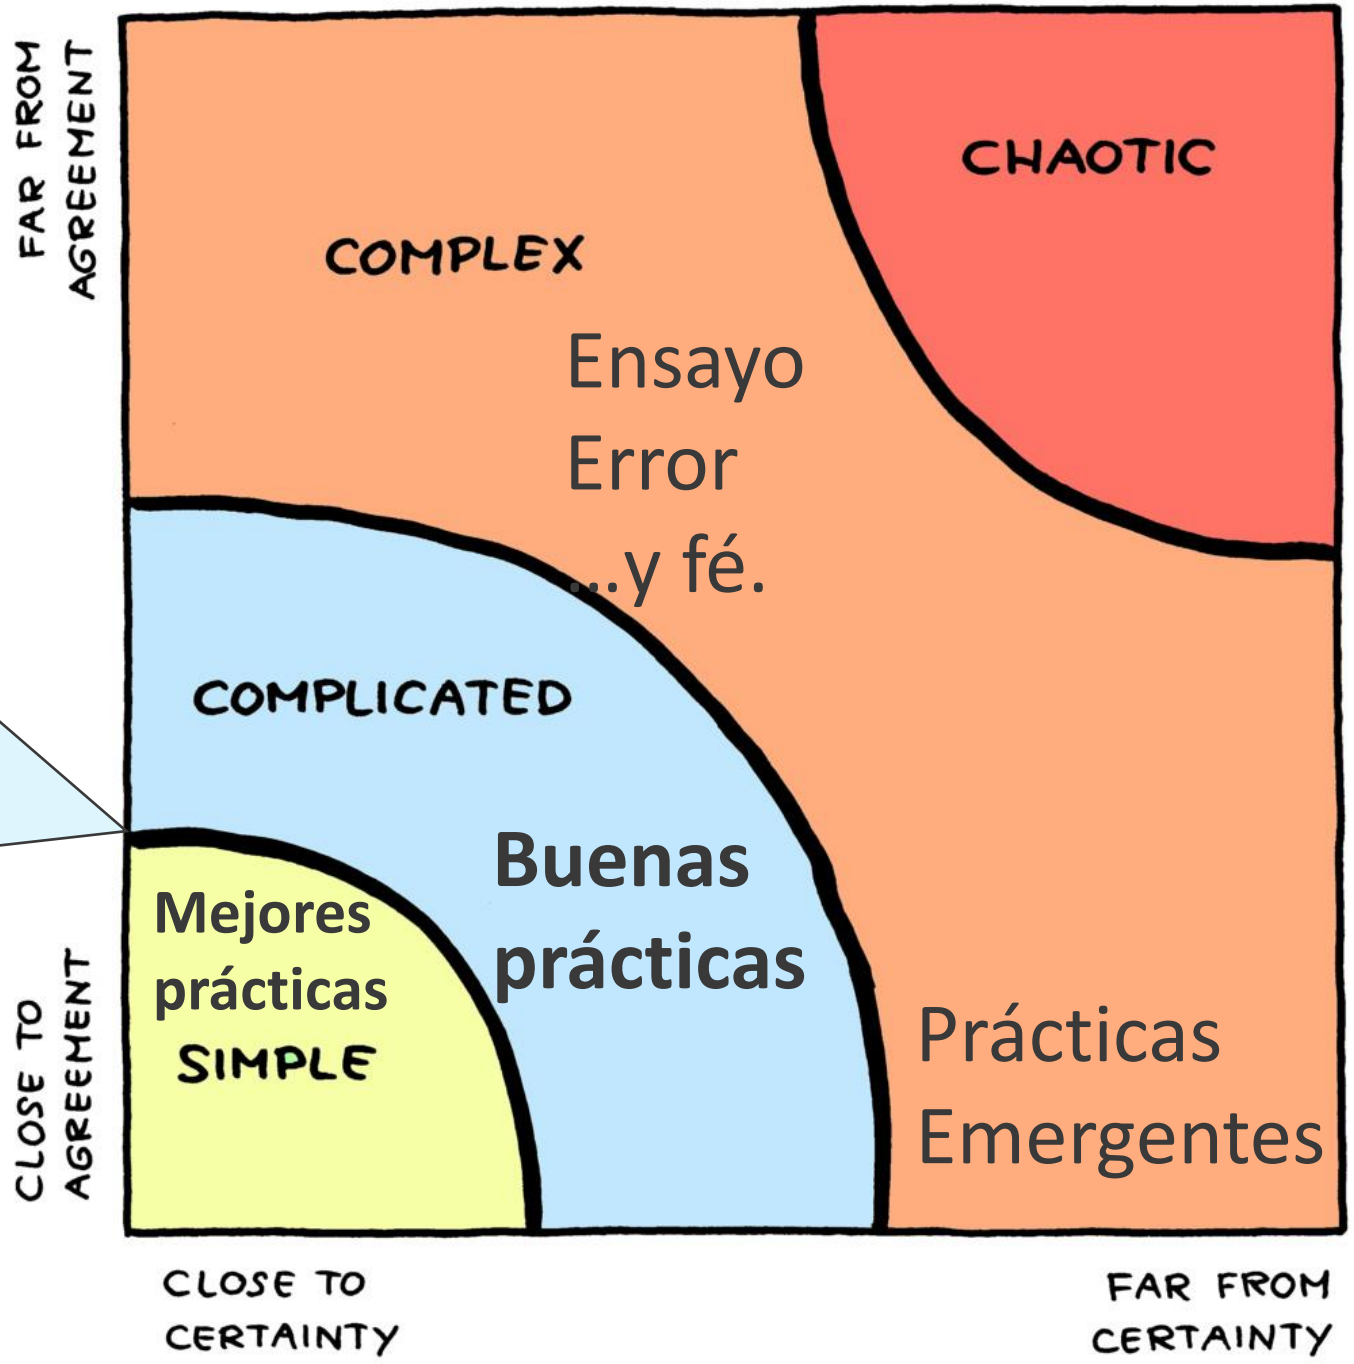

Proyecto 3. Alcance

Se requiere terminar de construir la misma plataforma, adicionando dos módulos adicionales, uno para vender servicios de analítica previamente creados que la comunidad aporta, y otro para ofrecer servicios de capacitación en el uso de infraestructuras distribuidas para el procesamiento de grandes volúmenes de datos. La arquitectura general de los tres módulos ya está implementada, al igual que las interfaces gráficas de los servicios a ser prestados.

El alcance del proyecto consiste en terminar la implementación de los servicios. Los requerimientos ya están bien especificados y los diseños aprobados.

El cliente desea que la plataforma esté lista en 3 meses, y pretende que se empiece a usar el primer módulo al final del mes 1, el segundo al final del mes 2 y el tercero al final del mes 3.

- Posible cambio, complejidad baja.
- Entregas parciales requeridas o deseables.

Solución con…

- Entregas constantes, completas (incrementos).

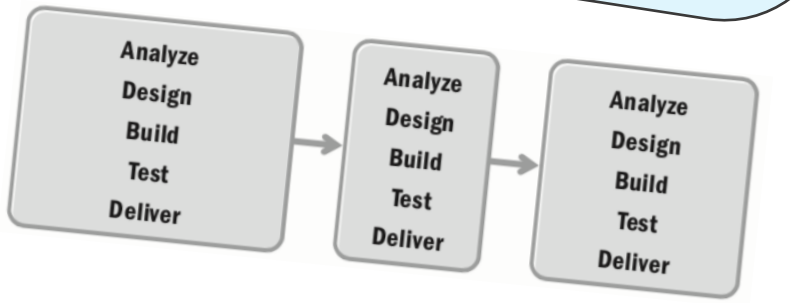

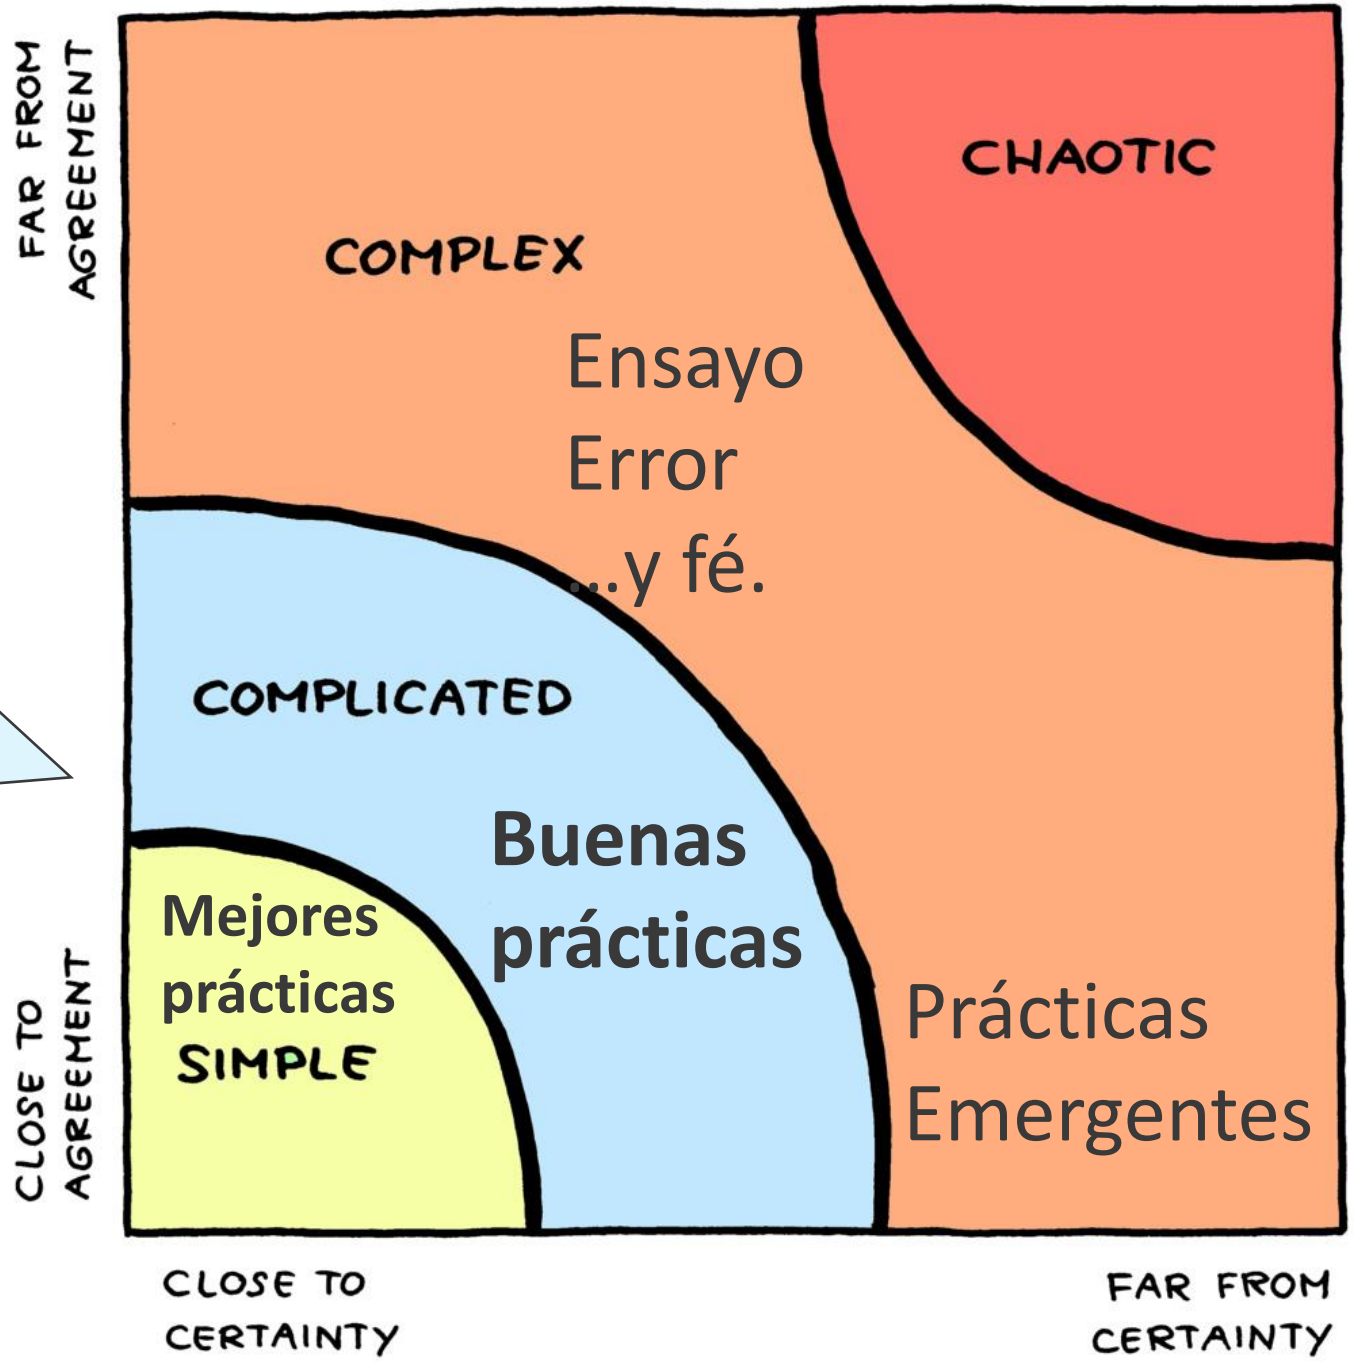

Proyecto 4. Alcance

Se requiere terminar de construir la misma plataforma, adicionando dos módulos adicionales, uno para vender servicios de analítica previamente creados que la comunidad aporta, y otro para ofrecer servicios de capacitación en el uso de infraestructuras distribuidas para el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

En este punto, los requerimientos funcionales no están especificados; no se ha pasado de la visión de producto. El alcance del proyecto consiste en desarrollar todo el producto.

Los clientes tienen una idea de lo que quieren, pero desean construir algo ”muy comercial”, que puedan vender fácil.

El cliente desea que la plataforma esté lista en menos de 6 meses, pero está consciente que depende de él principalmente el avance del proyecto.

- Lo anterior + **requerimientos cambiantes o aún no descubiertos**.
- Lo anterior no funciona

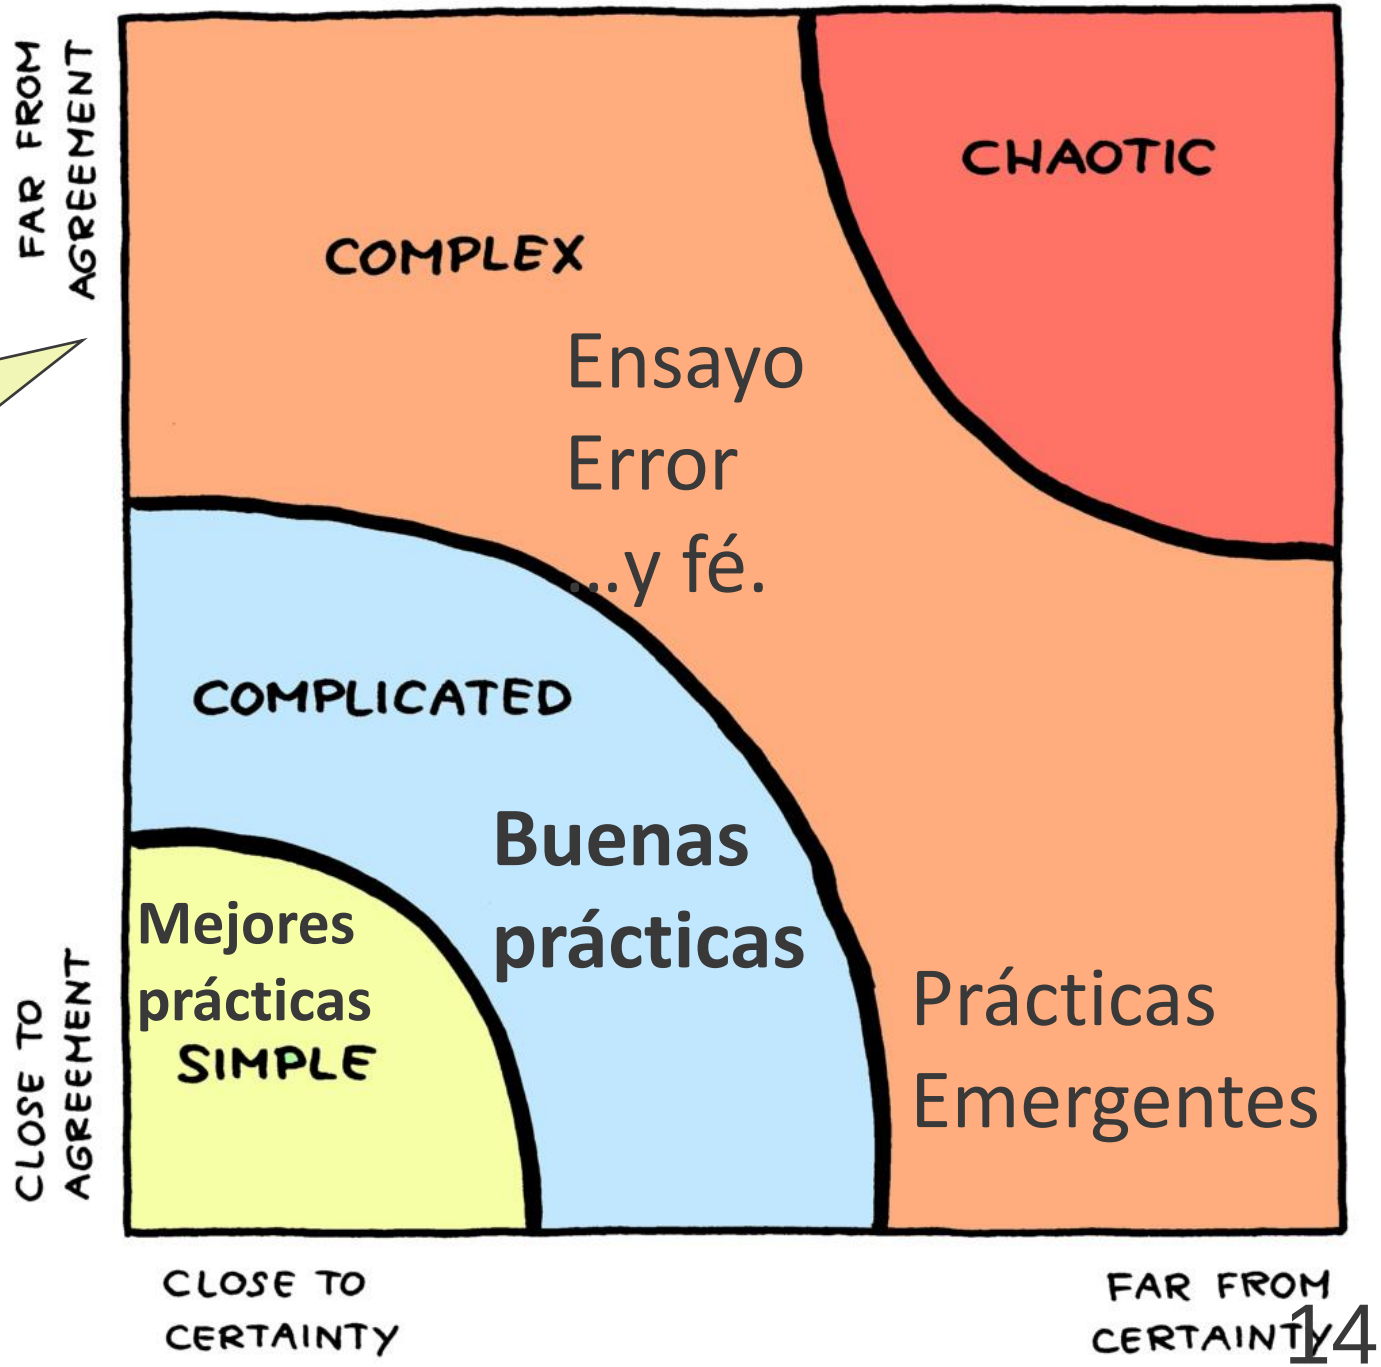

En resumen...

Predictivo

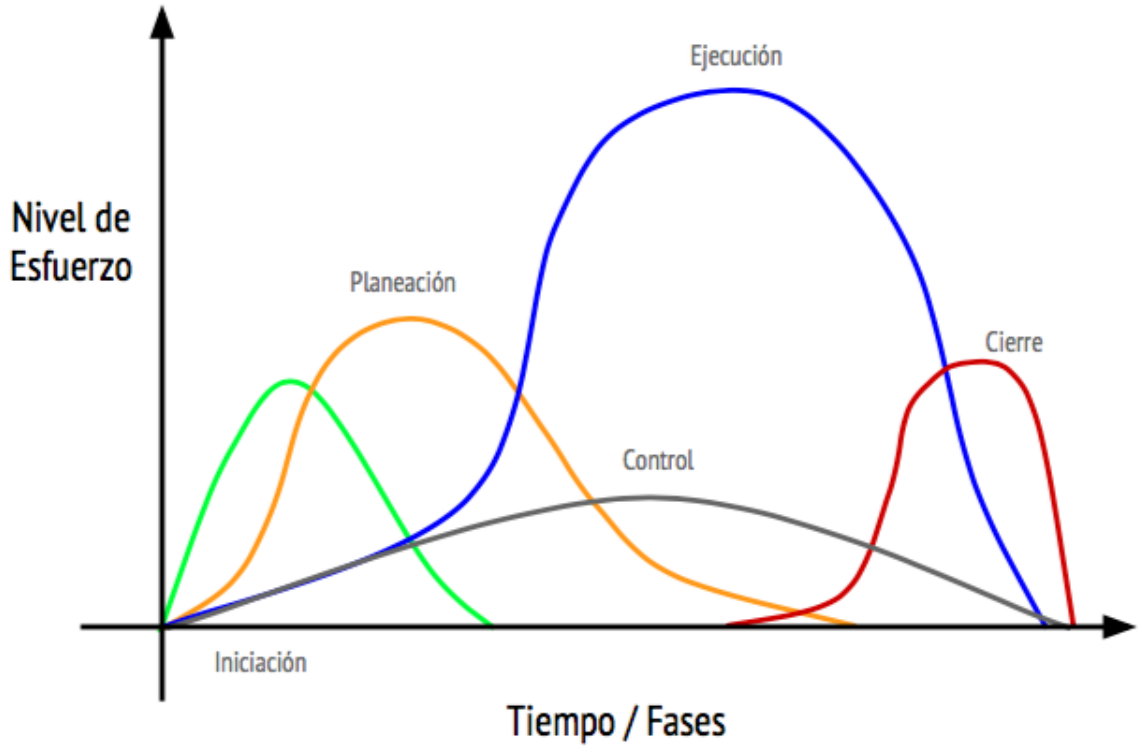

Ágil

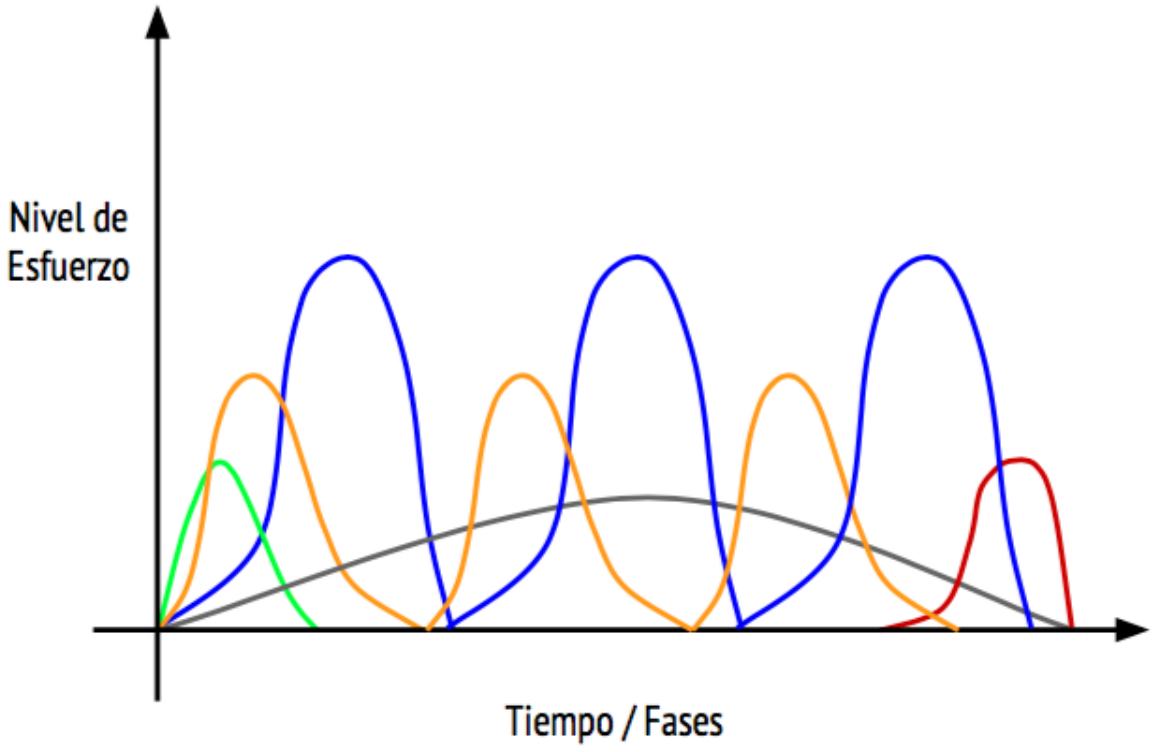

Cuándo/cómo podemos/debemos mezclar lo ágil con lo predictivo?

Mezcla de ciclos de vida



Riesgo y porca certeza inicial

En proceso de “agilizarse”



Componentes inciertos o complejos

Componentes no negociables



Asignación para sesión 5

- Documentar el ciclo de vida para el proyecto propuesto anteriormente con su equipo, usando una hoja de Excel que represente un ***cronograma***.

- Preparar lectura acerca de procesos para el enfoque predictivo.

Universidad ICESI

¡Gracias!
